



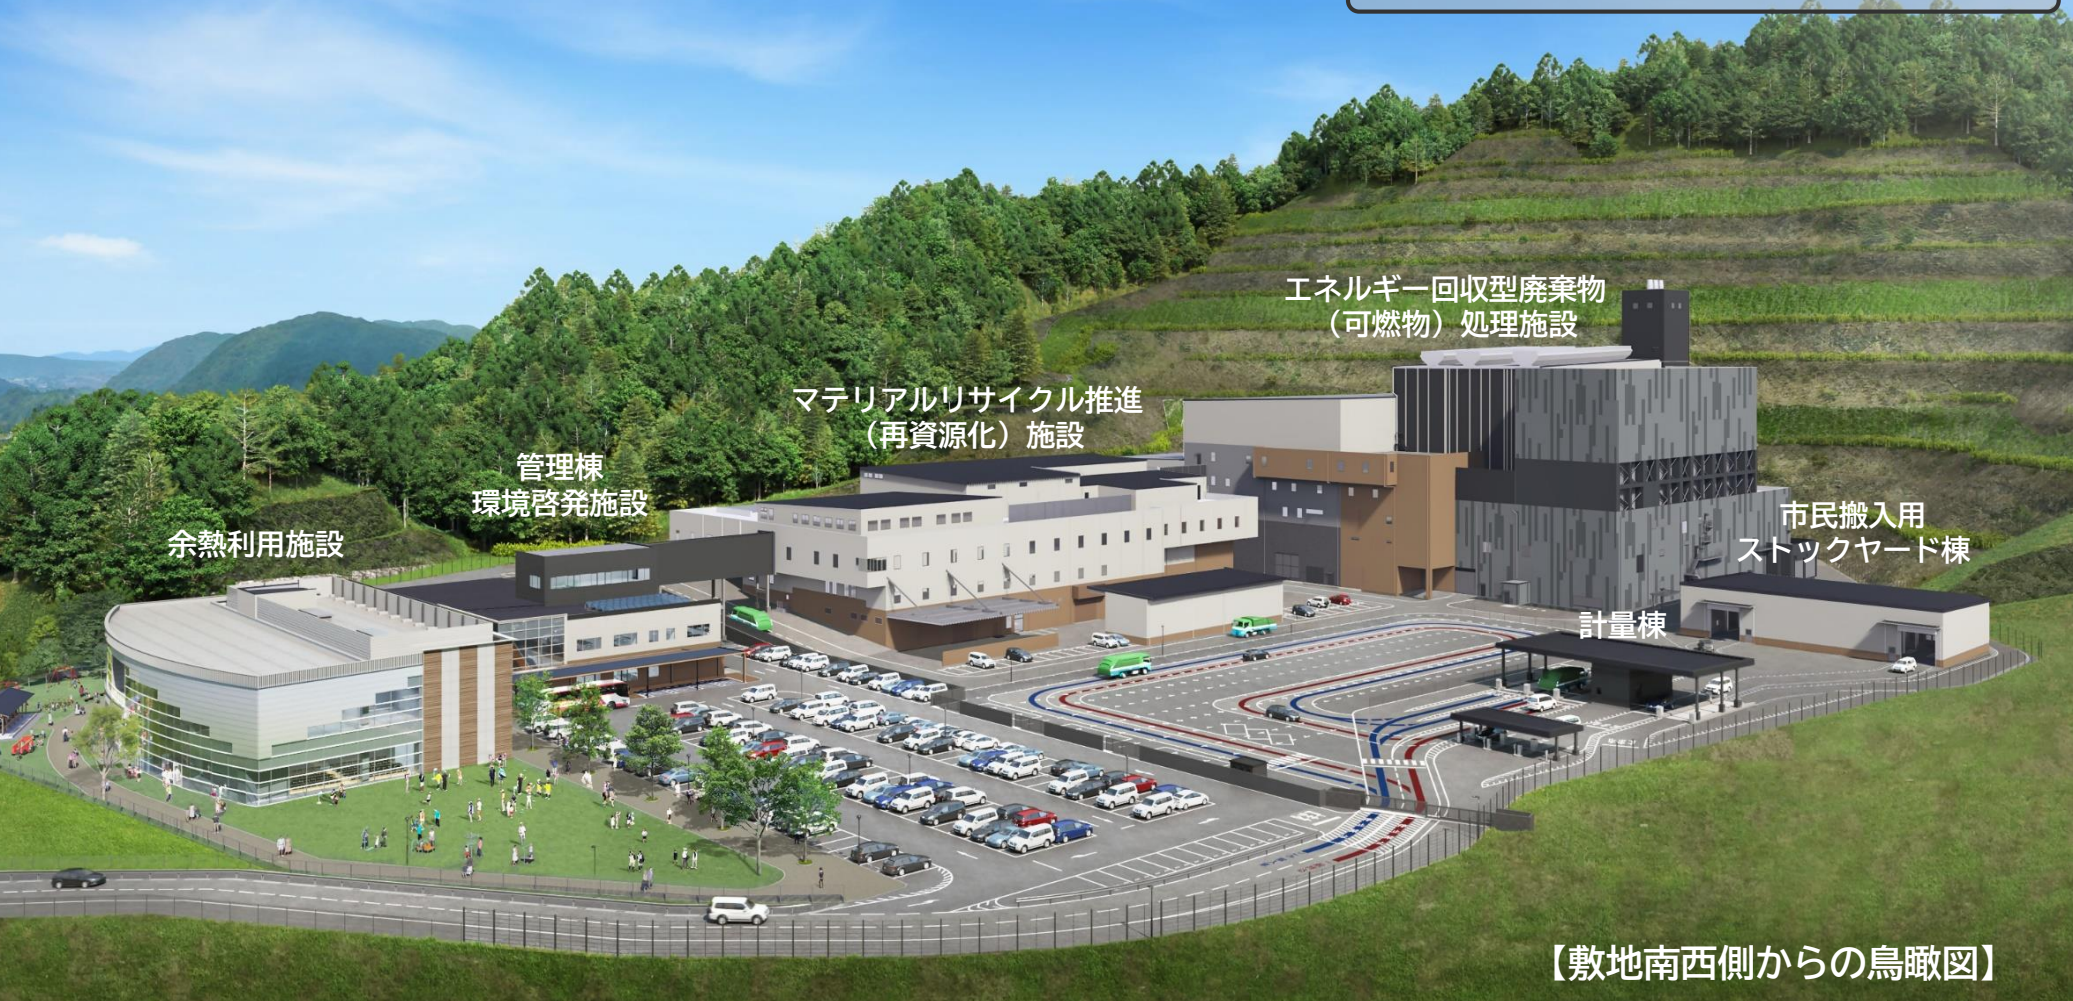

新環境センター整備事業 【進捗状況】

令和7(2025)年6月27日 大分市清掃事業審議会

大分市環境部清掃施設課



新環境センター整備の概要

新環境センターと周辺のごみ処理施設



工事概要

事業名称	新環境センター整備事業
建設場所	大分市大字上戸次学工ヶ谷 770番外107筆
契約工期	令和5年7月14日～令和9年9月30日
発注者	大分市（臼杵市、津久見市、竹田市、 豊後大野市、由布市との共同処理）
受注者	株式会社大分クリーンシステム
発注者技術支援	株式会社エイト日本技術開発
建築物 設計施工監理	大有設計株式会社
プラント機器 設計施工監理	株式会社日建技術コンサルタント

スケジュール

	令和5年度 4月 7月 10月 1月	令和6年度 4月 7月 10月 1月	令和7年度 4月 7月 10月 1月	令和8年度 4月 7月 10月 1月	令和9年度 4月 7月 10月 1月
工事内容	● 事業契約 ● 造成着工	● 土木・建築 工事着工	● プラント 工事着工		● 竣工
主要工場棟		造成工事	地下躯体工事	地上工事	試運転
付帯施設				付帯施設工事・外構工事	

供用開始
(10月)



建設工事の状況（令和6年1月～令和7年3月）

2024年1月（着工前）



2024年8月（杭工事）



2025年3月（地下躯体工事）






工事進捗（令和7年5月末時点）

〈進捗率〉造成工事：99.9% 建築工事：13.6% プラント設備工事：0%


令和7年5月末時点で造成工事はほぼ終了し、令和6年8月から開始した建築工事については、リサイクル施設の1階躯体工事が進んでおり、焼却施設もまもなく地上躯体工事が始まります。また、令和7年6月からはプラント設備工事が始まります。

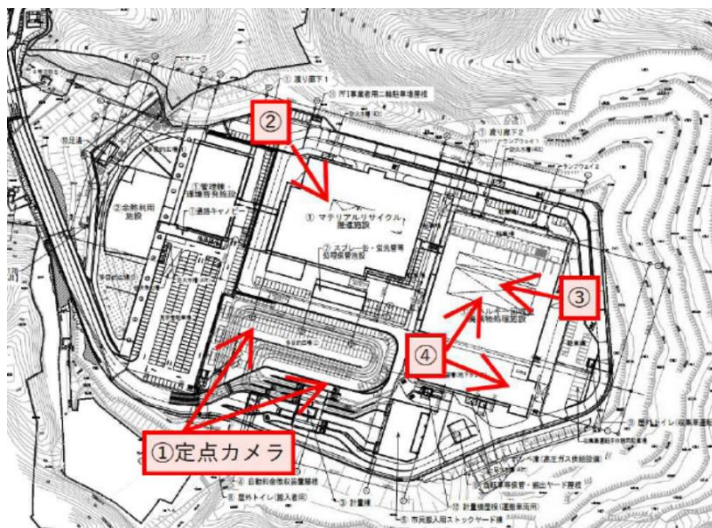

キープラン



①焼却施設：鉄筋型枠工事・リサイクル施設：鉄筋型枠工事

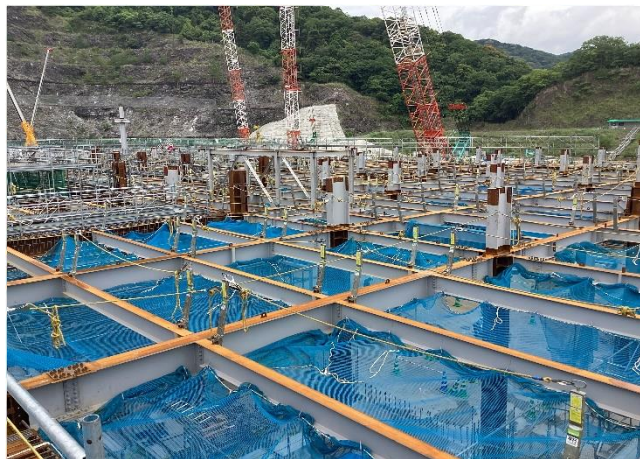

②リサイクル施設：地中梁



③焼却施設：ゴミピット



④焼却施設：灰ピット周り
