

滝尾中部まちづくりニュース【第28号】

発行日 2026(令和8)年5月1日

発行 滝尾中部地区住環境整備促進協議会

編集 大分市都市計画部まちなみ整備課

都市計画道路片島松岡線の事業進捗について

令和7年度は、令和5年度から引き続き、JR豊肥本線直下（位置図：青色部分）の工事に着手し、地区の皆さまのご理解とご協力により進んでおります。また、市道加納滝尾中学校線から東側約70メートル区間（位置図：灰色部分）について道路築造工事を行いました。

進捗状況写真

工事前（JR豊肥本線直下部工事箇所）



令和7年度末施工中（JR豊肥本線直下部工事箇所）




工事前（令和7年度平面区間）



工事後（令和7年度平面区間）



位置図

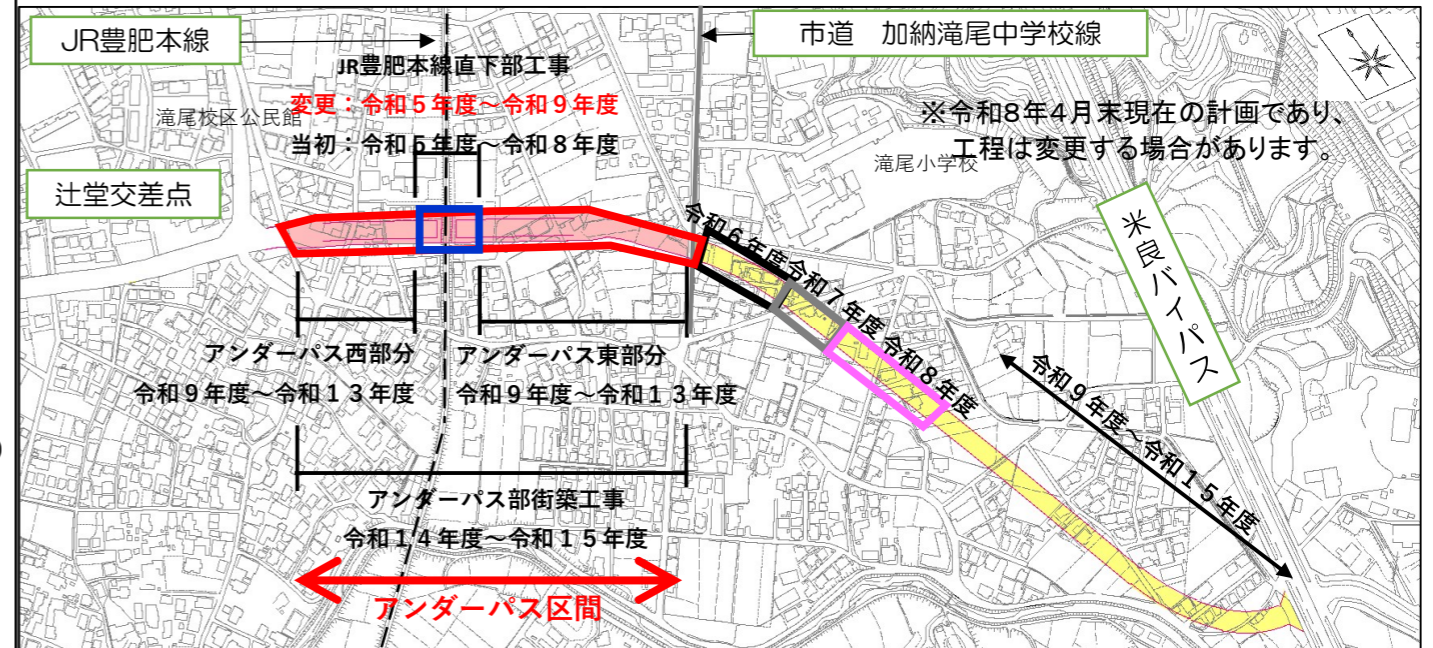

今後の全体工事計画として、アンダーパス区間については、JR豊肥本線直下部工事を令和5年度から令和9年度まで行い、アンダーパス東西部分を令和9年度から令和13年度までに行う予定です。その後、アンダーパス区間の側道の整備等を行い、令和15年度に供用を開始する予定です。また、アンダーパス区間以外（位置図：黄色部分）についても並行して土地所有者に協力していただきながら、工事を進めていきます。

令和8年度は、引き続きJR豊肥本線直下の工事を進めるとともに、令和7年度に行った区間から東側（位置図：ピンク色部分）について道路築造工事を行います。

工事の際は道路の通行止め等、地区の皆さまにはご迷惑をおかけしていますが、今後とも事業の推進に向けてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【お知らせ】JR豊肥本線直下工事については、令和8年度に完了予定でありましたが、現地の軟弱地盤対策等に想定以上の時間を要したため、工事完了期限を令和9年度まで延伸を致しました。

（※現時点では延伸に伴うアンダーパス東西部分の工事期間に影響ありません）

お
問
合
せ

都市計画道路片島松岡線に関するお問い合わせの際は、下記の担当班までご連絡をお願いいたします。電話番号：097-585-5154（直通）は共通です。

- 用地買収についてのお問合せ → 「用地調整担当班」
- 道路工事についてのお問合せ → 「街路整備担当班」

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市都市計画部まちなみ整備課
